Eurovia Midi-Pyrénées - Montauban
1649 avenue d'Italie

82000 - MONTAUBAN

Tél: +33 5 63 25 13 50
Fax: +33 5 63 30 89 90

Chantier : RUE GUILERAN

S0 - PLANNING PREVISIONNEL

Responsable Travaux : Baptiste MAYRAN
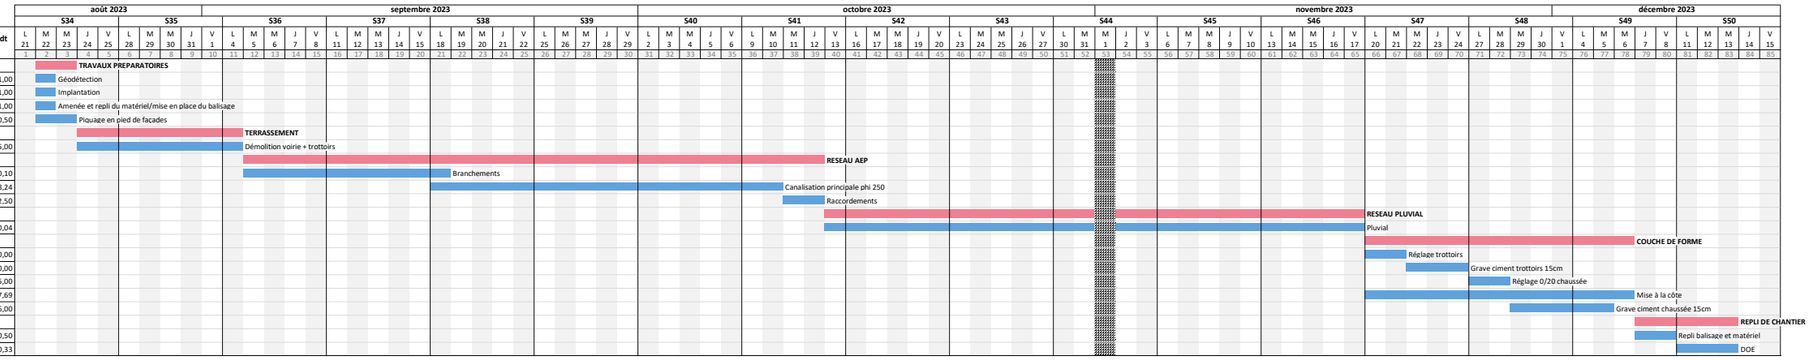
N°	Tâches	Durée	Unité	Qté	Rdt
1	**TRAVAUX PREPARATOIRES**	2			
1.1	**Géodétection**	1	fft	1,00	1,00
1.2	**Implantation**	1	fft	1,00	1,00
1.3	**Amenée et repli du matériel/mise en place du balisage**	1	fft	1,00	1,00
1.4	**Piquage en pied de façades**	2	fft	1,00	0,50
2	**TERRASSEMENT**	8			
2.1	**Démolition voirie + trottoirs**	8	m²	1000,00	125,00
3	**RESEAU AEP**	28			
3.1	**Branchements**	10	u	1,00	0,10
3.2	**Canalisation principale phi 250**	17	ml	140,00	8,24
3.3	**Raccordements**	2	u	5,00	2,50
4	**RESEAU PLUVIAL**	25			
4.1	**Pluvial**	25	ml	1,00	0,04
5	**COUCHE DE FORME**	13			
5.1	**Réglage trottoirs**	2	m²	360,00	180,00
5.2	**Grave ciment trottoirs 15cm**	3	m²	360,00	120,00
5.3	**Réglage 0/20 chaussée**	2	m²	630,00	315,00
5.4	**Mise à la côte**	13	u	1,00	7,69
5.5	**Grave ciment chaussée 15cm**	5	m²	630,00	126,00
6	**REPLI DE CHANTIER**	5			
6.1	**Repli balisage et matériel**	2	fft	1,00	0,50
6.2	**DOE**	3	fft	1,00	0,33
